


中瀬2丁目耐震管水道工事週間工程表

12月19日(月)～12月25日(日)

工期：令和5年2月15日まで
工事時間(昼間)：9時～17時
工事時間(夜間)：21時～5時

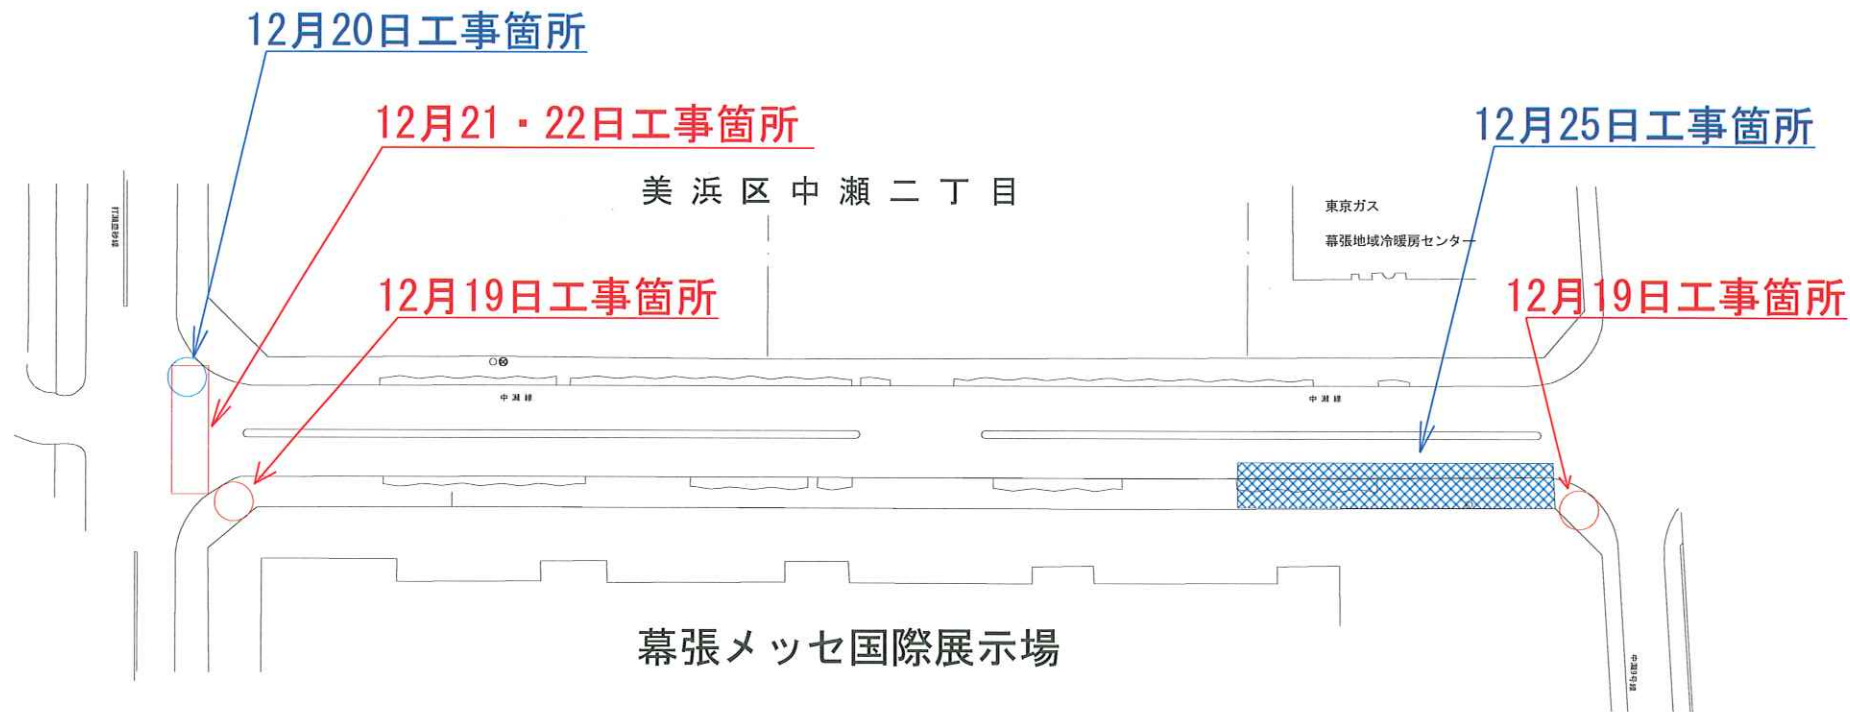

地震災害に対応した耐震性、長期耐久性に優れた水道管へ取り換える工事を行っています。
歩道内での工事の為、車線規制にて工事を行い、歩行者通路を車道に設けての工事となります。
安全には、細心の注意を払い行いますのでご協力をお願いします。
雨天時、調整の為、中止順延になる事があります。

かずさ総建株式会社 TEL 043-305-5100
現場代理人 奈留

日付	
12月19日(月)	仮配管洗浄作業・舗装切断作業
12月20日(火)	車線規制での栓設置工
12月21日(水)	車線規制での古い水道管の撤去
12月22日(木)	車線規制での古い水道管の撤去
12月23日(金)	休工
12月24日(土)	休工
12月25日(日)	歩道部水道管理設
