


週間予定表

工事名 千葉市花見川区幕張5丁目447番地先配水管整備工事
令和5年2月1日～10月10日

7/25、27(火、木) 施工箇所(車両通行止め) 2日間

7/28,29(金、土) 施工箇所(車両通行止め) 2日間

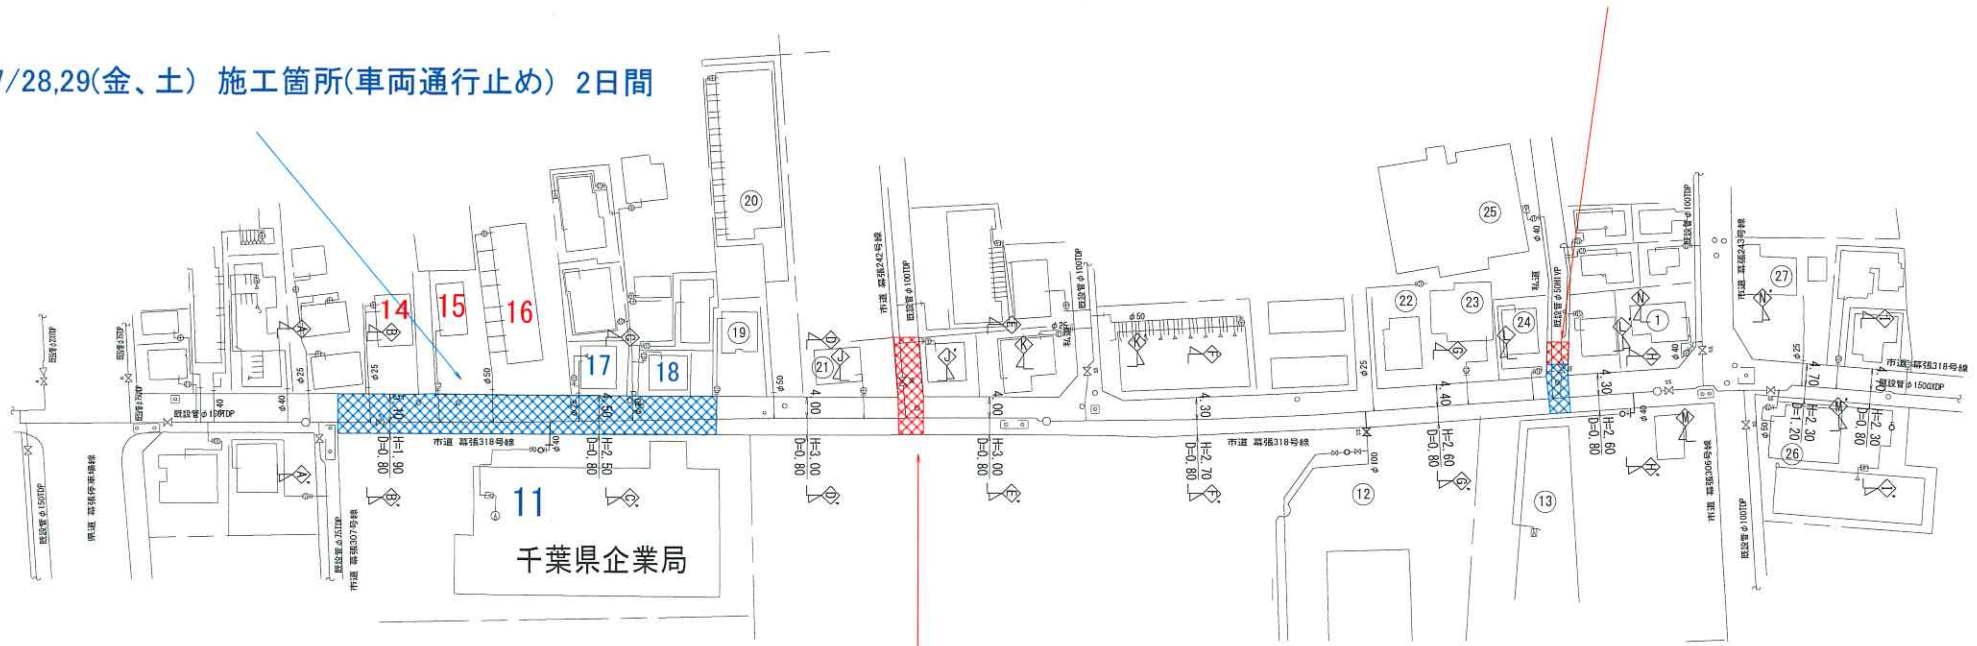

7/24(月) 施工箇所(車両通行止め)

※作業箇所は目安です。
進捗状況により前後致しますので
何卒よろしくお願い致します。
工事中は交通規制(通行止め及び片側交互通行規制)
騒音、駐車場のお車の移動等
ご迷惑をお掛けする場合がありますが
細心の注意を払い工事を行いますので、
ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

日付	曜日	工事内容
7月 24日	月	栓取り外し連絡工φ100TDP
7月 25日	火	φ75GXDP布設工
7月 26日	水	休工
7月 27日	木	仮配管取り外し連絡工φ50HIVP
7月 28日	金	給水切替工 11.17.18
7月 29日	土	給水切替工 14.15.16
7月 30日	日	休工

ご意見ご要望がありましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

かずさ総建株式会社
現場担当者 酒匂 一也

電話043-305-5100
